


## سیستم مدیریت کلان طرح‌ها و پروژه‌ها ( T-PMS ):

سیستم مدیریت کلان پروژه اطلاعات پروژه‌های مختلف یک سازمان را جمع‌بندی و اطلاعاتی در سطح مدیریت ارشد سازمان ارائه می‌کند. همچنین برای سازمان‌های Holding امکان مدیریت پروژه‌های فعال در شرکت‌های مختلف فراهم می‌شود. هدف این سیستم فراهم آوردن اطلاعاتی است که بتواند مدیریت ارشد سازمان را در تصمیم‌گیری‌ها یاری کرده و همچنین امکان مدیریت بروز پروژه‌های سازمان را فراهم آورد.

### شرکت مادر ( Holding )

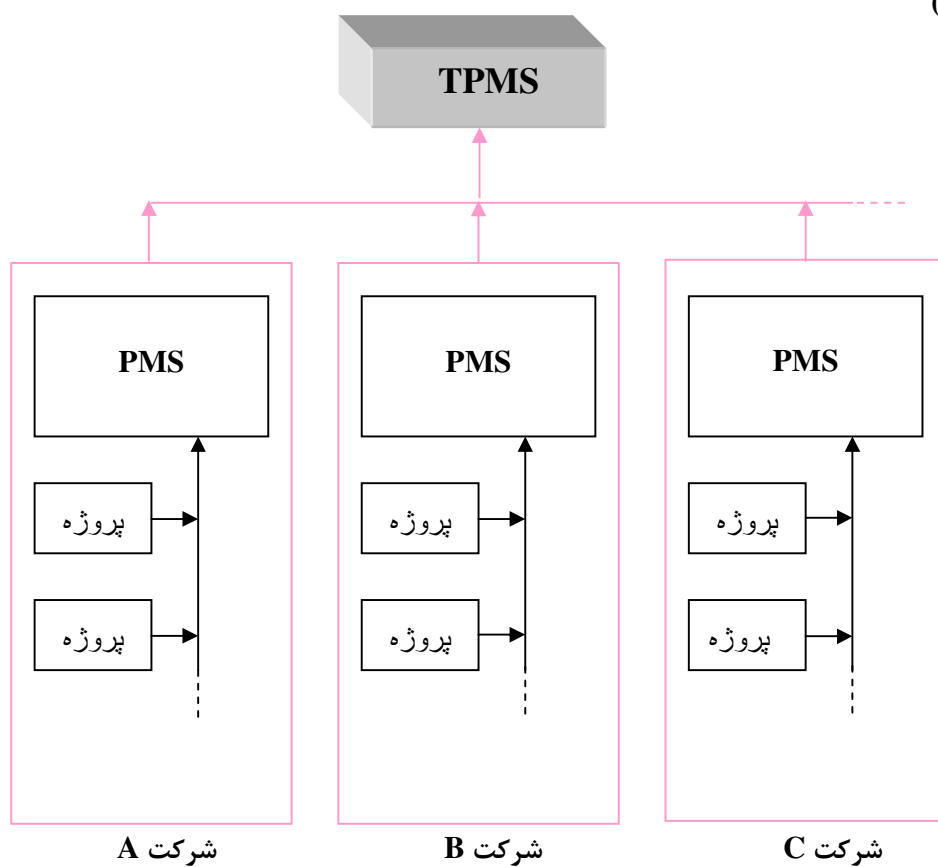

### امکانات سیستم:

- 1- امکان مانیتورینگ شرکت‌ها - پروژه‌ها
- 2- امکان مشاهده حجم ریالی پروژه‌ها
- 3- امکان مشاهده پروژه‌های فعال هر شرکت
- 4- امکان مانیتورینگ درصد پیشرفت برنامه‌ریزی شده برای هر پروژه
- 5- امکان مانیتورینگ درصد پیشرفت واقعی برای هر پروژه
- 6- امکان محاسبه و نمایش انحرافات از برنامه به تفکیک پروژه‌ها

- 7- امکان مشاهده تعداد روز مانده به پایان هر پروژه و همچنین مشاهده وضعیت پروژه
- 8- امکان مشاهده درصد پیشرفت واقعی پیش‌بینی شده شاخص‌های مدیریت پروژه (EPCF-T) بصورت نموداری و گزارش
- 9- امکان مانیتورینگ مشخصات عمومی و Detail پروژه‌ها.
- 10- امکان مشاهده پروژه‌هایی که در وضعیت بحرانی قرار دارند و همچنین مشاهده علل احتمالی وقوع حالت بحران

اطلاعات تکمیلی پروژه

مشخصات عمومی پروژه:

نام شرکت: شرکت نمونه | کد شرکت: ۴  
شرح پروژه: پروژه نمونه شماره یک | شماره پروژه: ۱۰۰۰۱  
مبلغ قرارداد: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | وضعیت پروژه: در جریان | تاریخ گزارش: ۱۳۸۶/۰۷/۰۲

مدیریت اطلاعات پروژه:

اتحراف	واقعی (صنکد)	برنامه ریزی (پیش‌بینی)	
	۱۳۸۶/۰۱/۰۱	۱۳۸۶/۰۱/۰۱	تاریخ شروع:
	۱۳۸۶/۰۶/۱۰	۱۳۸۶/۱۲/۱۲	تاریخ پایان:
۱۸۳	۱۶۴	۲۴۷	تعداد روز انجام پروژه:
۴۷	۴۴۸,۸۲۸,۸۸۸	۹۵۲,۱۰۰,۰۰۰	هزینه های مستقیم:
۶۳	۱۶۶,۱۸۲,۱۴۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه مواد:
۱۳	۱۳۸,۳۹۵,۵۴۰		هزینه های سربار:
۱۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۷۷۰,۰۰۰	حاشیه ریسک:
۰	-۲	۰	قیمت تمام شده:
۵۰	۴۷۱,۶۸۵,۳۷۷	۹۵۲,۸۷۰,۰۰۰	

خرج | چاپ

- 11- امکان مقایسه یک شاخص در پروژه‌های مختلف بصورت نموداری
- 12- امکان مقایسه وضعیت شاخص‌ها در یک پروژه بصورت نموداری
- 13- امکان مشاهده روند پیشرفت روزانه شاخص‌ها در پروژه‌های مختلف بصورت نموداری
- 14- امکان مشاهده روند پیشرفت ماهیانه شاخص‌ها در پروژه‌های مختلف بصورت نموداری
- 15- امکان مشاهده روند پیشرفت روزانه شاخص‌ها در یک پروژه در مقایسه با برنامه بصورت نموداری
- 16- امکان مشاهده روند پیشرفت ماهیانه شاخص‌ها در یک پروژه در مقایسه با برنامه بصورت نموداری
- 17- امکان مانیتورینگ هزینه‌های هر پروژه
- 18- امکان مشاهده روند حاشیه ریسک پروژه بصورت نموداری
- 19- امکان مقایسه حاشیه ریسک پروژه‌ها
- 20- امکان مشاهده تغییرات قیمت تمام شده پروژه بصورت نموداری
- 21- امکان فرمول نویسی برای شاخص‌ها جهت محاسبه حالت‌های بحران

بررسی پروژه های شرکت فعال													
کد پروژه	عنوان پروژه	درصد پیشرفت برنامه ریزگ شده	درصد پیشرفت واقعی	انحراف	تعداد روز مانده به پایان پروژه	وضعیت پروژه	وضعیت شاخصها						
۱۰۰۰۱	پروژه نمونه شماره یک	۶۸,۹۵	۶۴,۷۲۵	۶,۱۴	۵۴	در جریان	...						
۱۰۰۰۲	پروژه نمونه شماره دو	۱۵,۸	۱۱,۵	۲۷,۲۴	۵۷۰	در جریان	...						
۱۰۰۰۳	پروژه نمونه شماره سه	۵۵	۴۹,۲	۱۰,۵۵	۱۲۶	در جریان	...						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">درصد انحراف :</td> <td style="width: 15%;">۵۱,۷۱</td> <td style="width: 15%;">تعداد روز مانده به پایان پروژه :</td> <td style="width: 15%;">۵۷۰</td> <td style="width: 15%;">وضعیت :</td> <td style="width: 15%;">تمام</td> </tr> </table>								درصد انحراف :	۵۱,۷۱	تعداد روز مانده به پایان پروژه :	۵۷۰	وضعیت :	تمام
درصد انحراف :	۵۱,۷۱	تعداد روز مانده به پایان پروژه :	۵۷۰	وضعیت :	تمام								
